



Baumaßnahmen Eisenbahnknoten Köthen

DB Netz AG | Stand April 2019

Agenda

1. Ziele der Baumaßnahme
2. Baumaßnahme im Detail
3. Geplanter Bauablauf
4. Auswirkungen Straße
5. Berücksichtigung der Belange Betroffener
6. Information von Reisenden und Anwohnern

Die umfassenden Baumaßnahmen gewährleisten die Zukunftsfähigkeit der Bahninfrastruktur in Sachsen-Anhalt

- Erhalt der Verfügbarkeit der Strecken durch Instandsetzung Eisenbahninfrastruktur im Großraum Köthen
- 2019: Vorbereitung für weitere Arbeiten in den kommenden Jahren
- 2022: Beginn des Planrechtsverfahrens für die Modernisierung der Infrastruktur im Eisenbahnknoten Köthen (zum Beispiel die Erneuerung von Brücken und Bahnsteigen im Bahnhof Köthen)
- Zeitgleich Ausstattung des Abschnitts Köthen – Sachsendorf mit elektronischer Stellwerkstechnik




Bildquelle: Steffen Burkhardt/DB Netz AG

Die Leit- und Sicherungstechnik im Bahnhof Köthen wird 2019 vollständig erneuert

- Instandsetzung Bahnhof Köthen und Streckenabschnitt Köthen - Zöberitz
- Umrüstung vorhandene Stellwerkstechnik auf moderne elektronische Stellwerkstechnik (ESTW)

Bahnhof Köthen ②

- Erneuerung:
 - rund 4 Kilometer Gleise
 - 39 Weichen
 - 20 Kilometer Oberleitung
 - 20 Kilometer Kabeltrasse
 - 3,5 Kilometer Entwässerungsanlagen
- Neubau:
 - 5 Weichenheizungen
 - 230 Oberleitungsmasten inklusive Gründung
 - 80 Signale inklusive 58 Kilometer Signalkabel
- Ersatz Stellwerk durch elektronisches Stellwerkstechnik

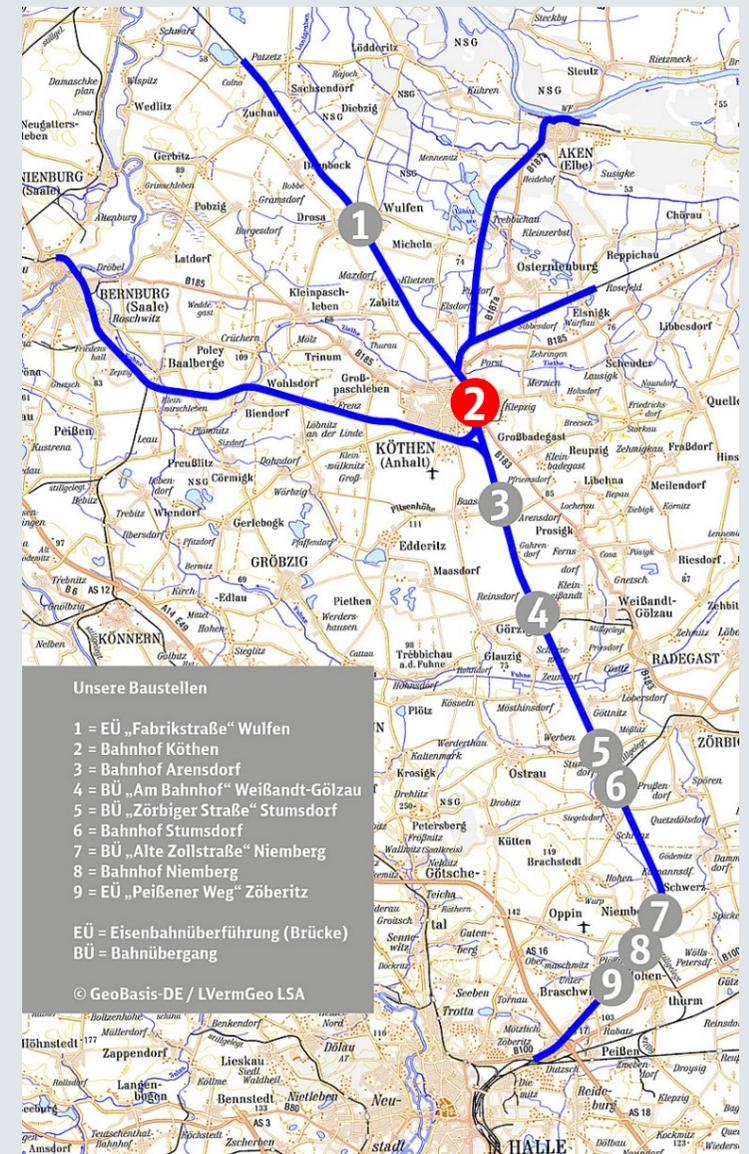

Bildquelle: GeoBasis-DE/LVermGeo LSA

Angrenzende Streckenabschnitte und Verkehrsstationen werden modernisiert

Bahnhof Arensdorf ③

- Erneuerung Bahnsteig 1

Bahnhof Stumsdorf ⑥


- Erneuerung:
 - rund 3 Kilometer Gleise
 - 2 Weichen
 - 3 Kilometer Oberleitung
- Installation von 2 Weichenheizungen
- Modernisierung Bahnübergang „Zörbiger Straße“
- Ersatz vorhandene Stellwerke durch modernes ESTW

Brückenbauwerke ① ⑨

- Neubau Eisenbahnüberführung „Fabrikstraße“ in Wulfen ①
- Neubau Eisenbahnüberführung „Peißener Weg“ in Zöberitz ⑨

Bahnübergänge ④ ⑤ ⑦

- Weißandt-Gölzau (Am Bahnhof/Kolonie Hedwig) ④
- Stumsdorf (Zörbiger Straße) ⑤
- Niemberg (Alte Zollstraße) ⑦

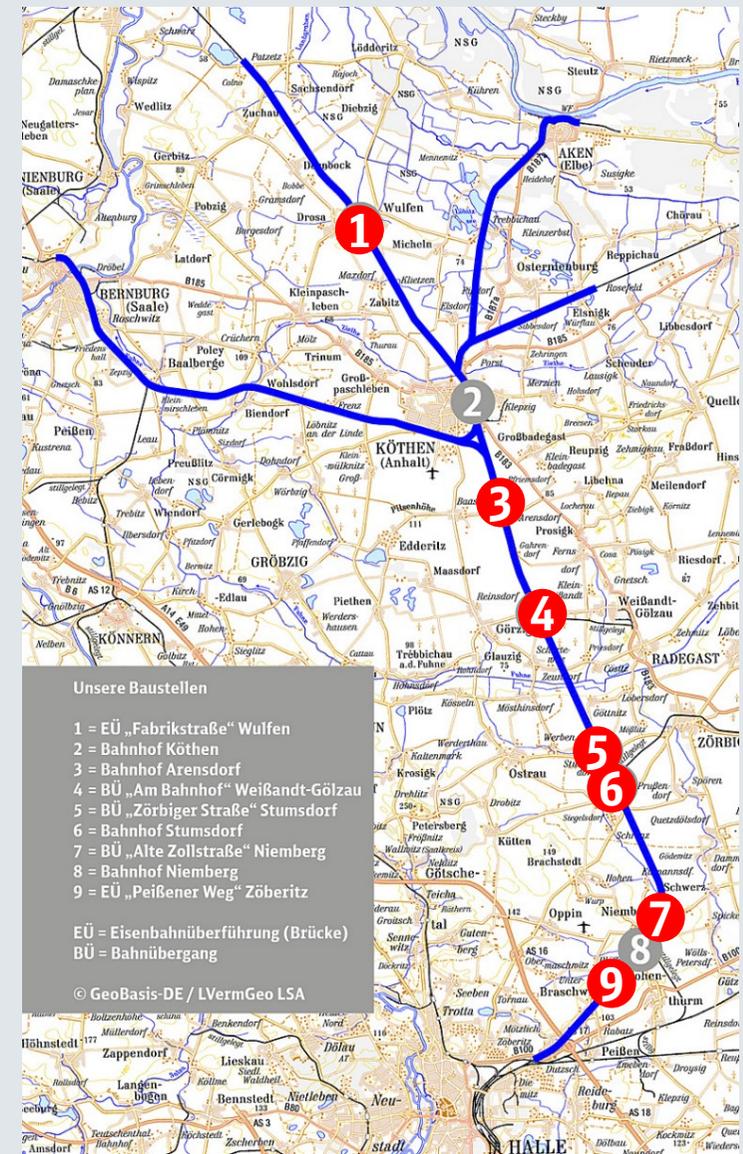

Bildquelle: GeoBasis-DE/LVermGeo LSA

Streckensperrungen garantieren kürzeste Bauzeit

- Strecke Baalberge - Köthen: 5.5. - 14.12.2019
- Sachsendorf - Köthen - Halle: 11.6. - 14.12.2019
- Köthen - Dessau 29.11. - 14.12.2019



Bildquelle: Volker Emersleben/Deutsche Bahn AG

Während der Streckensperrungen werden eine Vielzahl von Baumaßnahmen gebündelt (1/3)

9.4. – 4.5.2019

- Baulogistik
- Bauvorbereitung
- Bauvorbereitende Arbeiten Gleiserneuerung Biendorf - Köthen

5.5. – 7.5.2019

- Umsetzung Leit- und Sicherungstechnik-Bauzustand Westkopf Köthen
- Inbetriebnahme ESTW-R in Elsnigk und Dessau-Mosigkau
- Inbetriebnahme bauzeitliches ESTW-R Köthen
- Gleiserneuerung Biendorf - Köthen (4.5. – 7.6.2019)

7.5. – 10.6.2019

- Umbau Westkopf Köthen
- Versetzen Signal N2 in Sachsendorf
- Gleiserneuerung Biendorf - Köthen (4.5. – 7.6.2019)

Während der Streckensperrungen werden eine Vielzahl von Baumaßnahmen gebündelt (2/3)

11.6. – 29.11.2019

- Einbau Hilfsbrücken Eisenbahnüberführung Friedrich-Ebert-Straße Köthen
- Instandsetzung Bahnhof Köthen
- Gleiserneuerung Stumsdorf Gleise 1+2 sowie Erneuerung Oberleitungsanlage
- Verbreiterung/Neubau Bahnübergang Weißandt-Gölzau (Am Bahnhof/Kolonie Hedwig), Stumsdorf (Zörbiger Straße), Niemberg (Alte Zollstraße)
- Bauleistungen über Strecke Bernburg - Köthen
- Erneuerung Eisenbahnüberführung Fabrikstraße Wulfen (11.6. – 14.12.2019)
- Erneuerung Gleis Stumsdorf - Köthen [Höhe Straße „Nord“ südlich des Haltepunkts Weißandt-Gölzau] (13.6. – 21.6.2019)
- Erneuerung Eisenbahnüberführung Peißener Weg Zöberitz (23.6. – 14.12.2019)
- Stopfarbeiten Gleis Köthen - Stumsdorf (3.9. – 5.9.2019)
- Erneuerung Bahnsteig 1 in Arensdorf (Gleis Stumsdorf - Köthen) (9.9. – 22.9.2019)
- Erneuerung Gleis Stumsdorf - Köthen [Höhe Göttnitz/Bahnhaus bis Höhe Schortewitz/Zeundorfer Straße] (17.10. – 25.10.2019)

Während der Streckensperrungen werden eine Vielzahl von Baumaßnahmen gebündelt (3/3)

29.11. – 14.12.2019

- Umbau Ausfahrt Richtung Elsnigk
- Inbetriebnahme ESTW Köthen
- Zurückversetzen Signal N2 in Sachsendorf
- Erneuerung Eisenbahnüberführung Fabrikstraße Wulfen (11.6. – 14.12.2019)
- Erneuerung Eisenbahnüberführung Peißener Weg Zöberitz (23.6. – 14.12.2019)

15.12.2019

- Inbetriebnahme

Die umfangreichen Baumaßnahmen machen Straßensperrungen erforderlich (1/3)

Einbau Hilfsbrücken und Sperrzeit Eisenbahnüberführungen Friedrich-Ebert-Straße

- Abbruch der alten Brückenteile und Einbau der Hilfsbrücken erfolgt in der Zeit vom 17.6. bis 31.8.2019



Die umfangreichen Baumaßnahmen machen Straßensperrungen erforderlich (2/3)

Während der Arbeiten an den Bahnübergängen bleibt die Passierbarkeit für Fußgänger und Radverkehr die gesamte Bauzeit über gewährleistet.


Bahnübergang Niemberg/Alte Zollstraße

- 4.7. bis 7.7.2019: Vollsperrung Straße
- 8.7. bis 30.8.2019: Teilspernung Straße (einspurige Verkehrsdurchführung, Abbiegebeziehungen nicht möglich)
- 1.9. bis 30.9.2019: Vollsperrung Straße



Bahnübergang zwischen Schortewitz und Priesdorf/Zeundorfer Straße/Priesdorfer Straße

- 17.10.19 bis 25.10.2019: Vollsperrung Straße

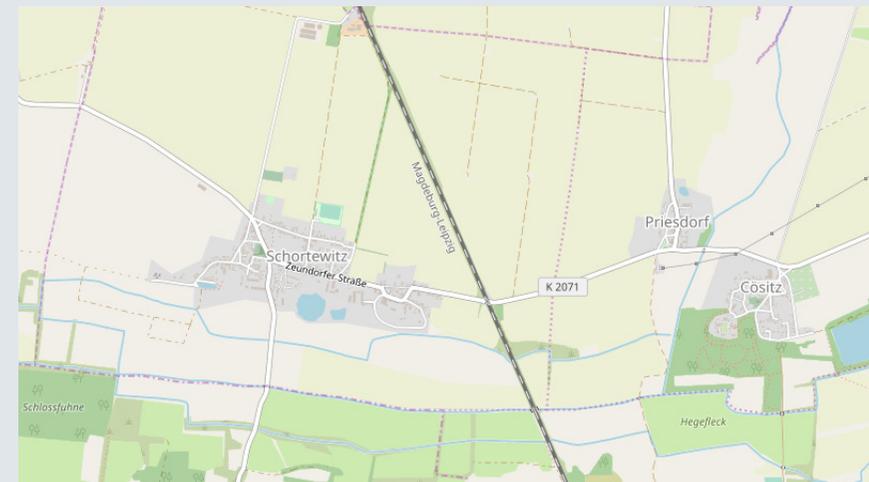

Die umfangreichen Baumaßnahmen machen Straßensperrungen erforderlich (3/3)

Während der Arbeiten an den Bahnübergängen bleibt die Passierbarkeit für Fußgänger und Radverkehr die gesamte Bauzeit über gewährleistet.



Während des Bauzeitraums ist jeweils einer der beiden Bahnübergänge Weißandt-Gölzau (Am Bahnhof/Kolonie Hedwig) und Höhe Schortewitz/Zeundorfer Straße immer befahrbar.

Bahnübergang Stumsdorf/Zörbiger Straße

- 12.7. bis 14.8.2019: Vollsperrung Straße
- 15.8. bis 15.9.2019: Teilspernung Straße (einspurige Verkehrsdurchführung, Abbiegebeziehungen nicht möglich)

Bahnübergang Weißandt-Gölzau (Am Bahnhof/Kolonie Hedwig)

- 1.8. bis 15.8.2019: Vollsperrung Straße
- 15.8. bis 15.9.2019: Teilspernung Straße (einspurige Verkehrsdurchführung, Abbiegebeziehungen nicht möglich)
- 01.10. bis 31.10.2019: Vollsperrung Straße

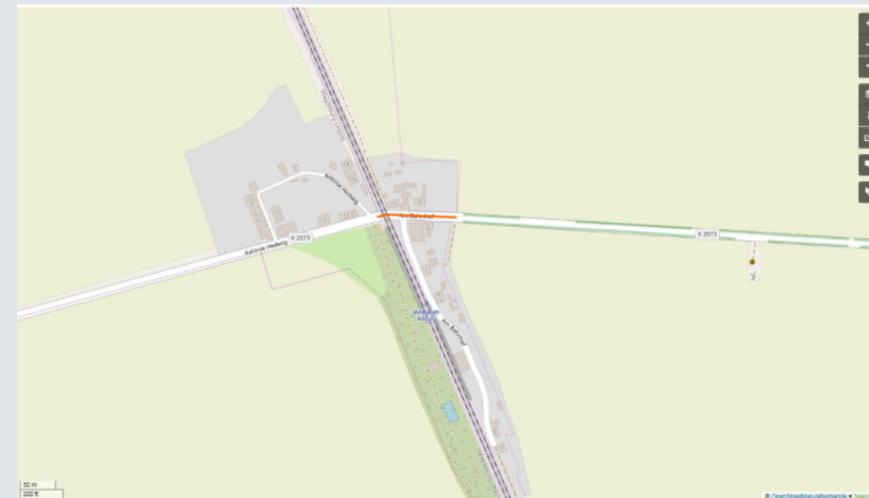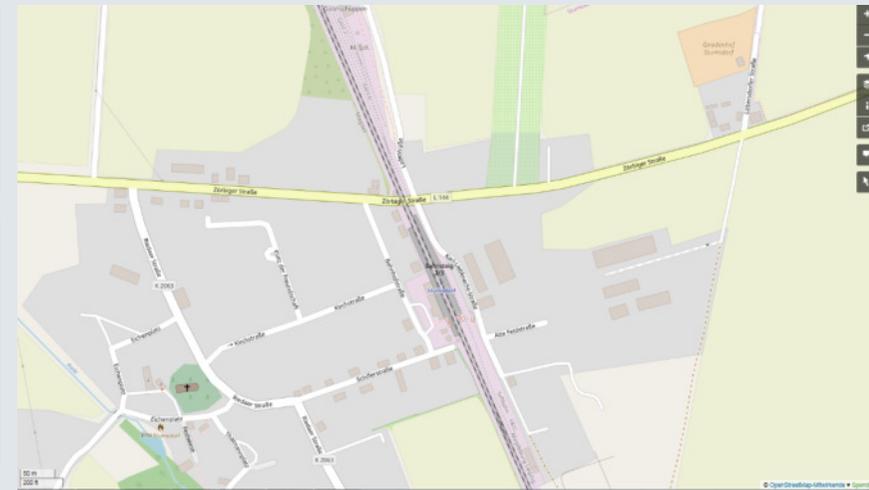

Eine Vielzahl von Maßnahmen reduziert Einschränkungen

- Gebündelte Umsetzung der Baumaßnahmen zur Beschleunigung des Umsetzungszeitraums
- Keine lärmintensiven Maßnahmen von 22 - 6 Uhr
- Baulogistik weitgehend über Schiene > Geringere Beeinträchtigung Straßenverkehr
- Offenlassen jeweils eines benachbarten Bahnübergangs
- Aufrechterhaltung Bahnverkehr zwischen Dessau und Köthen + Einsatz Schienenersatzverkehr
- Information durch Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Beschwerdehotline
- Lösungsorientierte Abstimmung vor Ort
- Maßnahmen im Bereich Natur- und Umweltschutz

Anwohner und Reisende werden über diverse Medien informiert (1/2)

Gut informiert durch die Baustellen



- Zeitkarten-Inhaber, bahn.bonus-Kunden und BahnCard 100-Kunden erhalten ein persönliches Anschreiben
- Kundenhotline 0180 699 6633
- www.bahn.de
- inside.bahn.de
- www.deutschebahn.com/bauinfos
- www.deutschebahn.com/bauprojekte



- Servicepersonal
- DB Information
- Reisezentrum
- Reisendenlenker
- Max Maulwurf



- Zugbegleiter
- ICE-Portal
- Infomonitore
- DB mobil



JEDERZEIT UND ÜBERALL


Apps: DB Navigator • DB Bauarbeiten • Streckenagenten des Nahverkehrs + www.twitter.com/db_presse

Deutsche Bahn AG, 02/2019

Anwohner und Reisende werden über diverse Medien informiert (2/2)



Poster

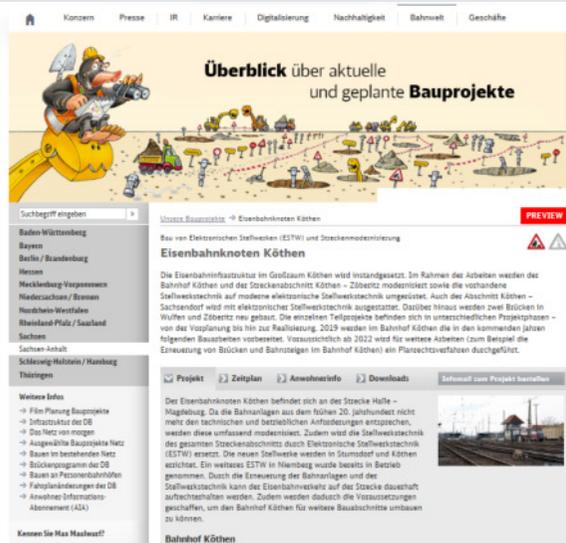

Bauinfoportal



Flyer

- Bürgerinformationsgespräche in Köthen, Niemberg und Stumsdorf im März und April
- Beschwerdehotline: Nummer wird vor Baubeginn veröffentlicht unter <https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/koethen-knoten>

- Informationen zu Fahrplanänderungen:
 - www.bahn.de
 - <https://www.bahn.de/p/view/service/mobile/db-navigator.shtml>
 - <https://reiseauskunft.inasa.de/bin/query.exe/dn>
 - <https://www.abellio.de/de/mitteldeutschland>
- Informationen zu Bauarbeiten:
 - <https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/koethen-knoten>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Informationen unter:

<https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/koethen-knoten>

Anwohner und Reisende werden über diverse Medien informiert (2/2)



**Information an
34 Verkehrsstationen**

